



STADIO COMUNALE

1

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

Priorità

5100



Lo stadio Comunale si trova a circa due chilometri a nord dal centro di Mesagne, in un'area di campagna. Si accede tramite una strada sterrata di circa 200 mt.

All'esterno delle mura di recinzione c'è una grande area verde destinata a parcheggio, senza parcheggi riservati.

Le aree interne dove insistono le tribune sono interamente asfaltate e non presentano dislivelli o pendenze eccessive, fatto salvo le soglie dei cancelli che andranno opportunamente raccordate con brevi rampe. Le tribune, una per lato, sono costituite da gradinate coperte, in cemento armato, alle quali si accede tramite due rampe di scale poste alle due estremità che conducono alla prima fila. Sul retro di ciascuna gradinata è presente un servizio igienico accessibile (il quale necessita l'inserimento di un ulteriore maniglione a lato del wc) il cui accesso avviene direttamente dall'area asfaltata tramite una rampa in cemento.

Gli interventi previsti sulle tribune sono l'inserimento di una piattaforma elevatrice che consenta di raggiungere l'ultima fila della gradinata. L'intervento potrebbe essere coordinato con l'inserimento di una pensilina che protegga il percorso per raggiungere il servizio igienico dalla piattaforma elevatrice. Le scale di accesso alle tribune andranno intercettate con segnaletica tattile a pavimento come pure la segnalazione di inizio e fine rampa. Si prevede inoltre la differenziazione cromatica dei gradini per facilitarne la lettura da parte di persone ipovedenti.



STADIO COMUNALE

1

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

Priorità

5100

1 - Stadio Comunale





STADIO COMUNALE

1

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

Priorità

5100

Destinazione d'uso

- ☐ Asilo nido
- ☐ Scuola materna
- ☐ Scuola elementare
- ☐ Scuola media inf.
- ☐ Scuola media sup. Uman.
- ☐ Scuola media sup. Comm.
- ☐ Scuola media sup. Tecn.
- ☐ Direzione didattica
- ☐ Uff. pubbl. statale
- ☐ Uff. pubbl. regionale
- ☐ Uff. pubbl. provinciale
- ☐ Uff. pubbl. comunale
- ☐ Azienda municipalizzata
- ☐ Chiesa
- ☐ Cimitero
- ☐ Ufficio postale
- ☐ Istituto di credito
- ☐ Ambulatorio A.S.L.
- ☐ Ospedale
- ☐ Day hospital
- ☐ U.S.L.
- ☐ Casa protetta, R.S.A.
- ☐ Centro sociale anziani
- ☐ Centro diurno
- ☐ Centro ricreativo
- ☐ Sede associazioni, sala circosc.
- ☐ Consultorio
- ☐ Centro handicap
- ☐ Centro sportivo polifunz.
- ☐ Centro sport. natatorio
- ☐ Centro sport. atletica
- ☒ Centro sport. calcio
- ☐ Palestra pubblica
- ☐ Centro sport. tennis
- ☐ Centro ippico
- ☐ Centro culturale
- ☐ Biblioteca
- ☐ Museo, pinacoteca
- ☐ Teatro, cinematografo
- ☐ Ristorante, albergo
- ☐ Pubblica sicurezza
- ☐ Sede giudiziaria
- ☐ Vari rivolti al pubbl.

Frequenza

- ☐ Bassa
- ☐ Media
- ☐ Alta
- ☒ Nessuna

Interesse turistico

- ☐ Basso
- ☒ Medio
- ☐ Alto
- ☐ Nessuno

Concentrazione di funzioni

- ☒ Bassa
- ☐ Media
- ☐ Alta
- ☐ Nessuna

Collocazione ambientale

- ☐ Centro storico
- ☐ Area urbana
- ☒ Periferia

Edificio storico



Condizione ambientale

STRADA CON TRAFFICO
VEICOLARE/PEDONALE

- ☒ Scarso
- ☐ Medio
- ☐ Alto

Variabile temporale

Lavori previsti entro i
primi 12 mesi a partire
dal 20.11.2020 ☐

Costo totale degli interventi proposti

- | | | |
|-----------|--------------------|----------------------------------|
| Minimo | da 0 a 10.000 | <input type="radio"/> |
| Contenuto | da 10.000 a 25.000 | <input type="radio"/> |
| Medio | da 25.000 a 50.000 | <input checked="" type="radio"/> |
| Alto | oltre 50.000 | <input type="radio"/> |

Criteri assoggettati a correttivi

- ☒ Edificio o ambienti di proprietà
- ☐ Edificio o ambienti dati in uso o gestione
- ☐ Completamento interventi già avviati
- ☐ Avvio di nuovo progetto

PRIORITA' CALCOLATA

5100

STRALCIO SUGGERITO


8° STRALCIO

Interventi previsti

- ☒ parcheggio
- ☐ segnaletica est.
- ☒ segnaletica int.
- ☒ percorso est.
- ☐ percorso int.
- ☒ pavimentaz. est.
- ☐ pavimentaz. int.
- ☐ pensilina di protezione
- ☒ rampa fissa est.
- ☐ rampa fissa int.
- ☐ servoscala est.
- ☐ servoscala int.
- ☐ corrimano est.
- ☐ corrimano int.
- ☒ ascensore est.
- ☐ ascensore int.
- ☐ accesso princ.
- ☒ accesso second.
- ☒ soglie, zerbini
- ☐ ausili est.
- ☐ mod.vano ascens.
- ☐ mod.cabina ascens.
- ☐ mod.comandi ascens.
- ☐ mod. infissi
- ☒ adeguam. serv. igienici
- ☐ costruz. serv. igienici
- ☐ mod. strutt. murarie
- ☐ inserim. stalli
- ☒ adeguam. arredi

Presenza di utenti

- ☐ Motori
- ☐ Sensoriali
- ☐ Cognitivi
- ☐ Pluripatologie
- ☐ Lievi

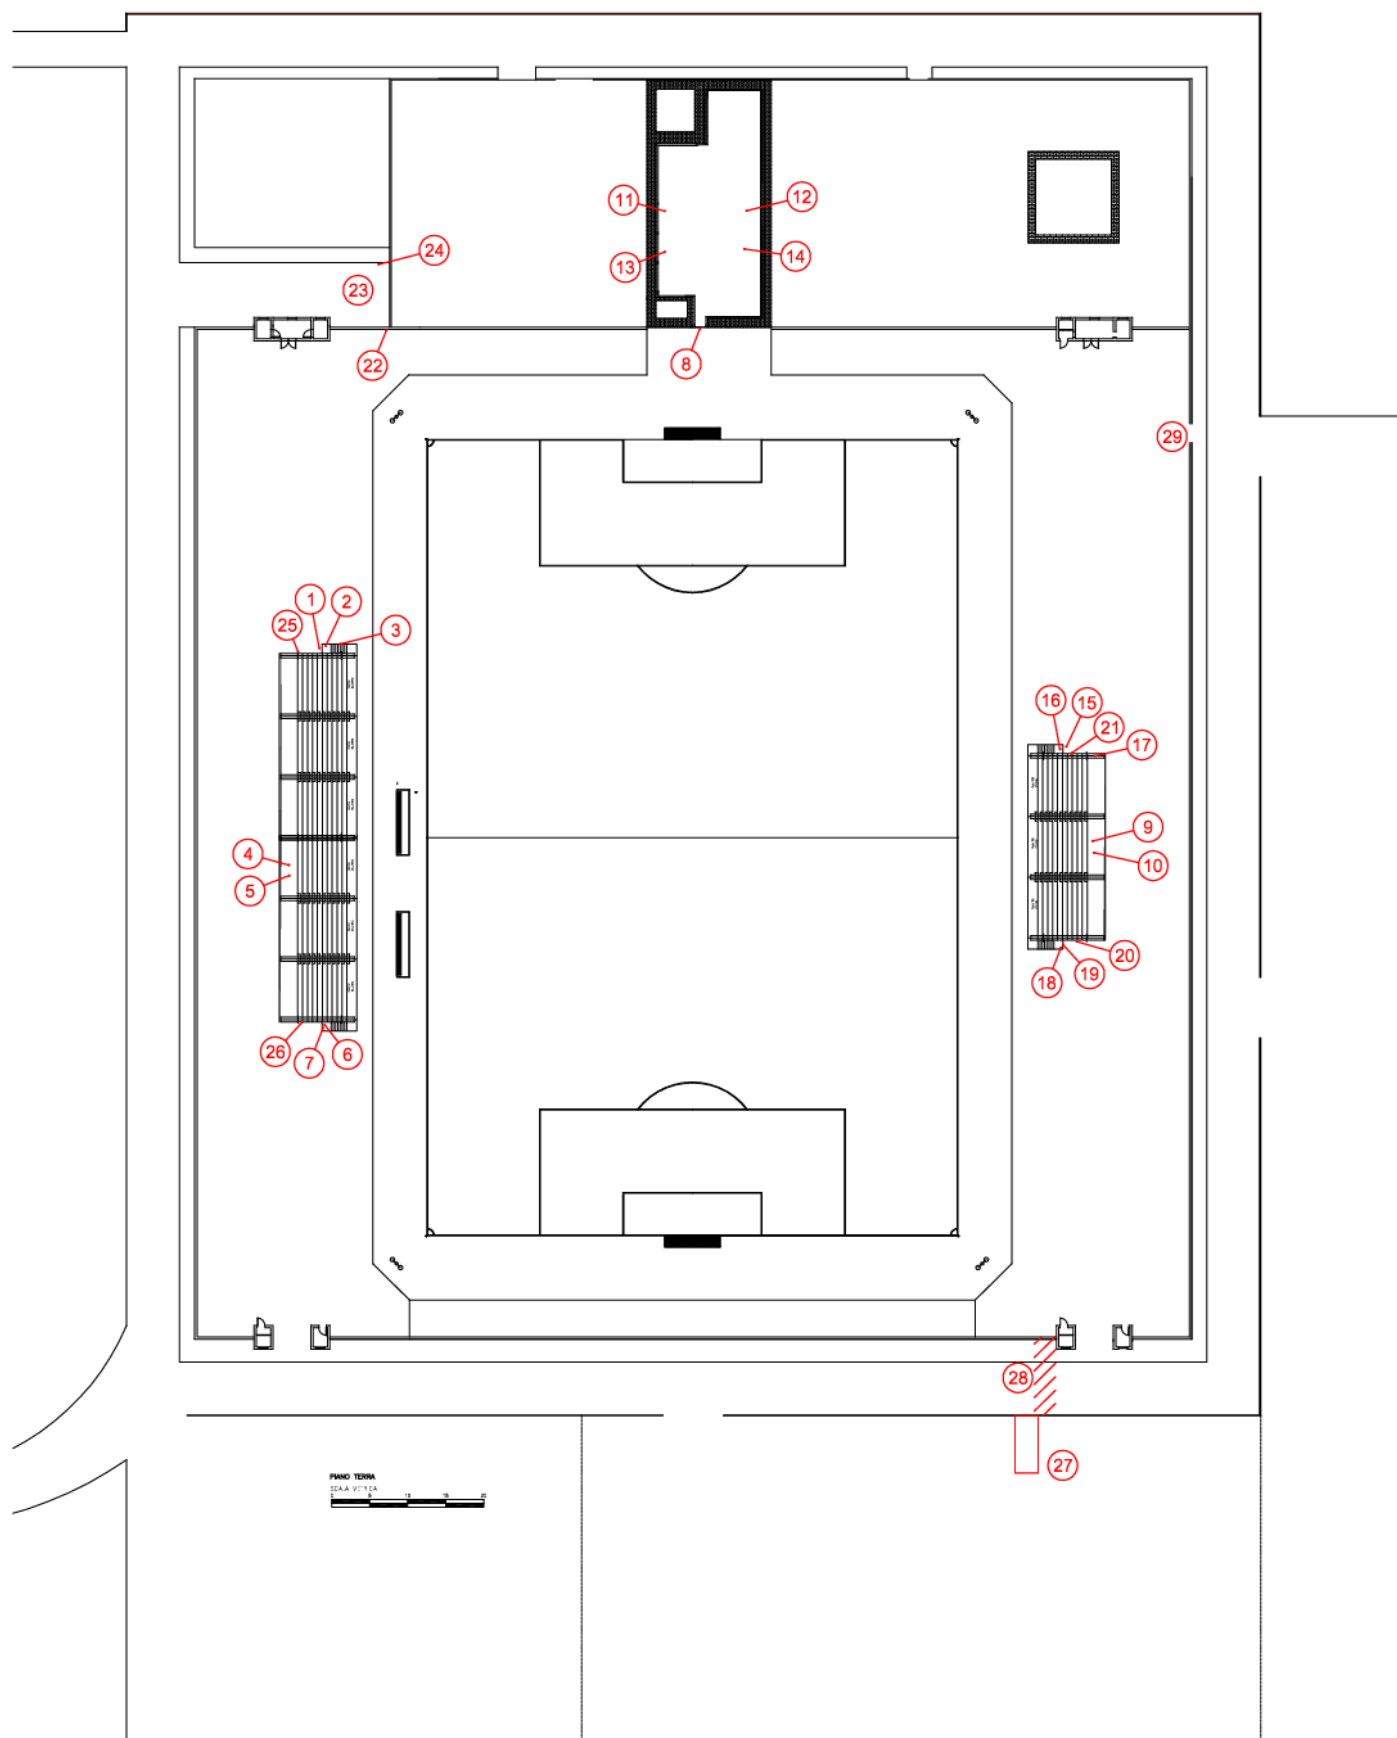

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-1

Criticità rilevata

Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare **l'inizio e la fine di una rampa scala** a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano

Materiale proposto:

**Tipo LogesVetEvolution
PVC**


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio

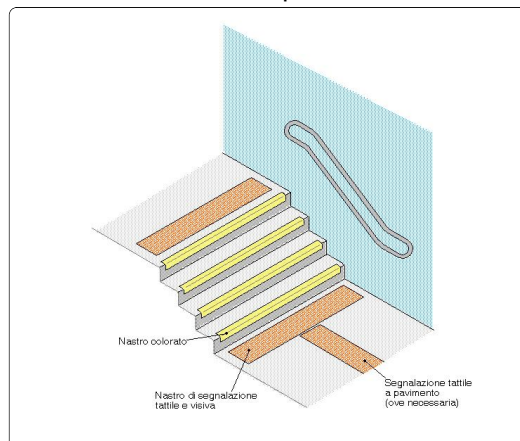

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

3

Stima scheda €. 280,00

Note integrative:

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-2

Criticità rilevata

Difficoltà di percezione della differenza di quota

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Adeguamento di una serie di gradini tramite **evidenziazione cromatica dell'angolo**: inserimento di fascia cromaticamente distinta dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima 10 cm, sulle pedate dei gradini, evidenziazione cromatica dell'alzata in modo da rendere visibili i gradini durante la salita.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.3 - 5.2 - 5.7
D.P.R. 503/96 art. 9 - 17
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

3

Stima scheda €. 150,00

Note integrative:

Esempio

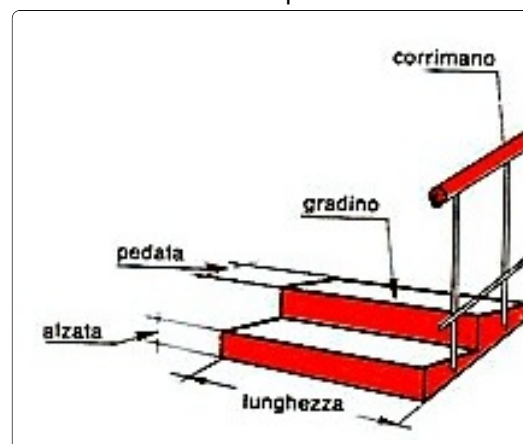

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-3

Criticità rilevata
piattaforma elevatrice: assenza

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Installazione di piattaforma elevatrice **con struttura in alluminio per esterno/interno.**

Dimensione del vano 1490x1600 mm

Corsa 6.30 m

Portata 250 Kg

Velocità 0.15 m/s

Fermate/servizi 3/3

Fossa 120 mm incassata

Distanza locale macchine – vano 1000 mm

Dislivello locale macchine – fossa 100 mm

Organi di sollevamento: Pistone oleodinamico.

Cabina: dimensioni interne 800x1200 mm

Profili in alluminio anodizzato

Cielino completo di luce d'emergenza in caso di blackout.

Ante di accesso in lamiera plastificata

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 12.000,00

Note integrative:

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-4

Criticità rilevata

Dislivello causato da **gradino max 2,5 cm**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Arrotondamento dell'angolo mediante fresatura del materiale.

La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)

Materiale proposto:

Marmo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

Foto del rilievo



Esempio

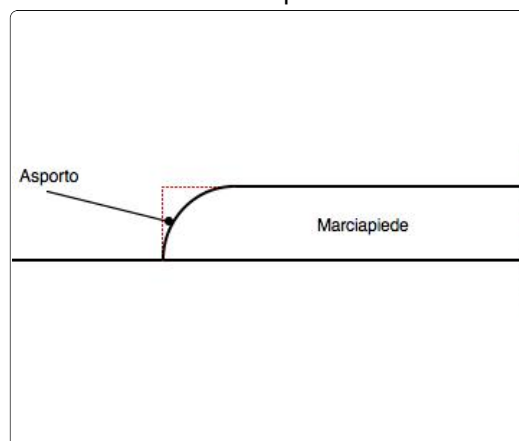

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
0,9

Stima scheda €. 140,00

Note integrative:

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-5

Criticità rilevata
Maniglione in posizione non adeguata

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Rimozione del maniglione esistente e installazione di un nuovo maniglione ad altezza dal pavimento e distanza dall'asse del WC adeguate

Foto del rilievo

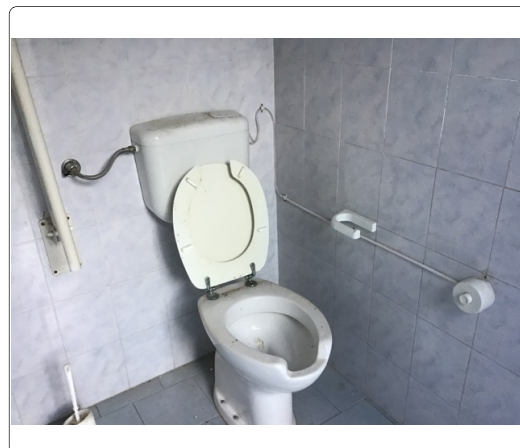

Esempio

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 180,00

Note integrative:

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-6

Criticità rilevata

Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare **l'inizio e la fine di una rampa scala** a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano

Materiale proposto:

**Tipo LogesVetEvolution
PVC**


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio

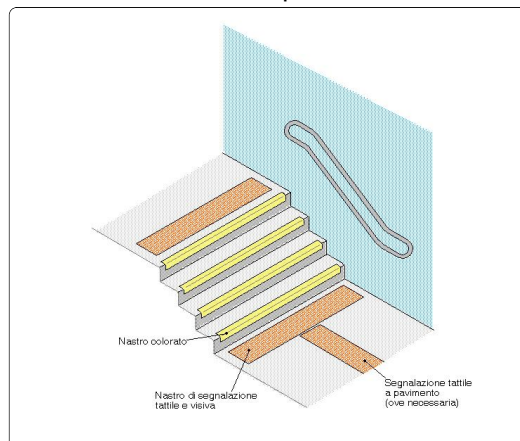

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

3

Stima scheda €. 280,00

Note integrative:

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-7

Criticità rilevata

Difficoltà di percezione della differenza di quota

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Adeguamento di una serie di gradini tramite **evidenziazione cromatica dell'angolo**: inserimento di fascia cromaticamente distinta dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima 10 cm, sulle pedate dei gradini, evidenziazione cromatica dell'alzata in modo da rendere visibili i gradini durante la salita.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.3 - 5.2 - 5.7
D.P.R. 503/96 art. 9 - 17
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

3

Stima scheda €. 150,00

Note integrative:

Esempio

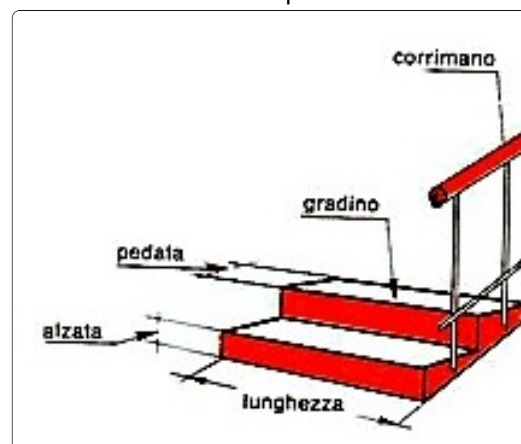

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-8

Criticità rilevata

Dislivello causato da **gradino max 2,5 cm**

Localizzazione intervento

Spogliatoio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la **sovrapposizione di uno strato bituminoso** su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7

Foto del rilievo



Esempio

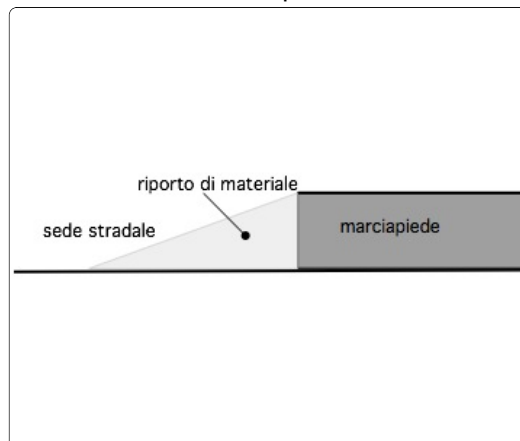

Lunghezza: 1,2 Larghezza: 0,4 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 280,00

Note integrative:

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-9

Criticità rilevata

Dislivello causato da **gradino max 2,5 cm**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Arrotondamento dell'angolo mediante fresatura del materiale.

La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)

Materiale proposto:

Marmo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

Foto del rilievo



Esempio

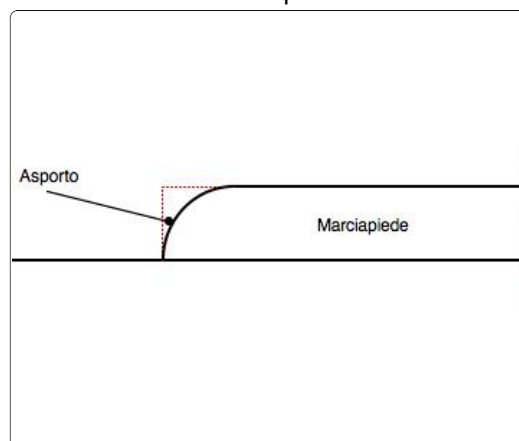

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
0,9

Stima scheda €. 140,00

Note integrative:

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-10

Criticità rilevata
Maniglione in posizione non adeguata

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Rimozione del maniglione esistente e installazione di un nuovo maniglione ad altezza dal pavimento e distanza dall'asse del WC adeguate

Foto del rilievo

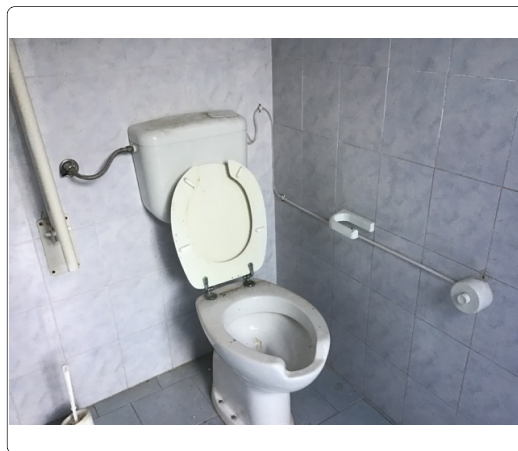

Esempio

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 180,00

Note integrative:

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-11

Criticità rilevata

Attaccapanni: **posizione inadeguata**

Localizzazione intervento

Spogliatoio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento di attaccapanni a muro.

L'attaccapanni utilizzato da persone adulte dovrà essere posizionato ad un'altezza di circa 160 cm dal piano del pavimento, avendo cura di porre alcuni appendini anche all'altezza di cm 120 che verranno utilizzati da persone di bassa statura o su sedia a ruote. In caso di utilizzo prevalente da parte di bambini l'attaccapanni sarà posto alle seguenti altezze: cm 100 per scuole materne e cm 120 per scuole elementari.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Foto del rilievo



Esempio

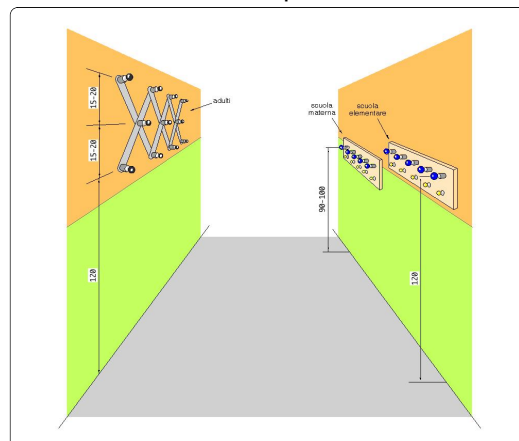

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 60,00

Note integrative:

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-12

Criticità rilevata

Attaccapanni: **posizione inadeguata**

Localizzazione intervento

Spogliatoio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento di attaccapanni a muro.
L'attaccapanni utilizzato da persone adulte dovrà essere posizionato ad un'altezza di circa 160 cm dal piano del pavimento, avendo cura di porre alcuni appendini anche all'altezza di cm 120 che verranno utilizzati da persone di bassa statura o su sedia a ruote. In caso di utilizzo prevalente da parte di bambini l'attaccapanni sarà posto alle seguenti altezze: cm 100 per scuole materne e cm 120 per scuole elementari.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Foto del rilievo



Esempio

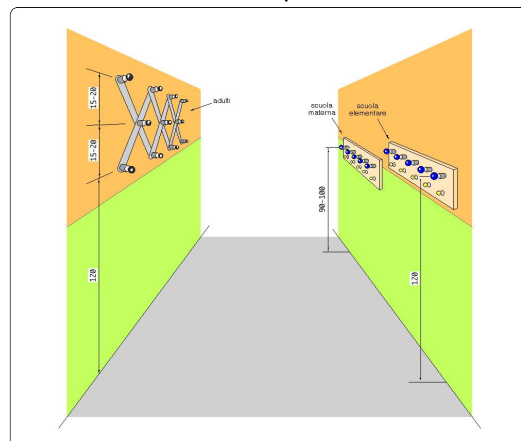

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 60,00

Note integrative:

Secondo spogliatoio

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-13

Criticità rilevata
Maniglione in posizione non adeguata

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Rimozione del maniglione esistente e installazione di un nuovo maniglione ad altezza dal pavimento e distanza dall'asse del WC adeguate

Foto del rilievo

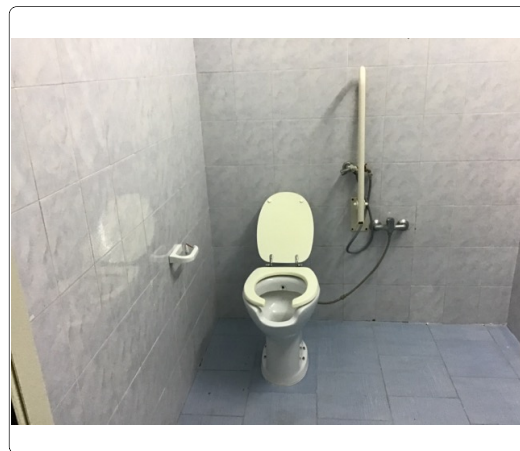

Esempio

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 180,00

Note integrative:

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-14

Criticità rilevata
Maniglione in posizione non adeguata

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Rimozione del maniglione esistente e installazione di un nuovo maniglione ad altezza dal pavimento e distanza dall'asse del WC adeguate

Foto del rilievo

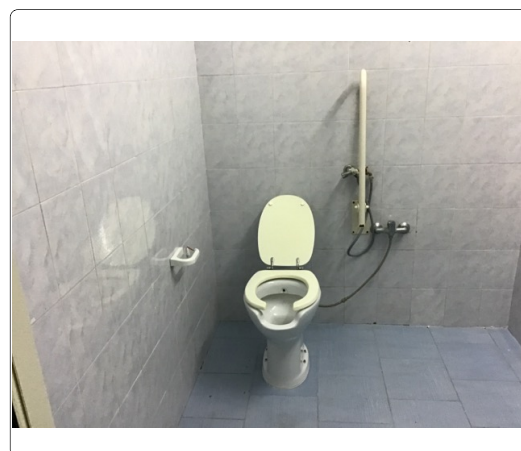

Esempio

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 180,00

Note integrative:

Servizio privo di sciacquone.

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-15

Criticità rilevata

Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare **l'inizio e la fine di una rampa scala** a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano


Materiale proposto:

**Tipo LogesVetEvolution
PVC**


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo

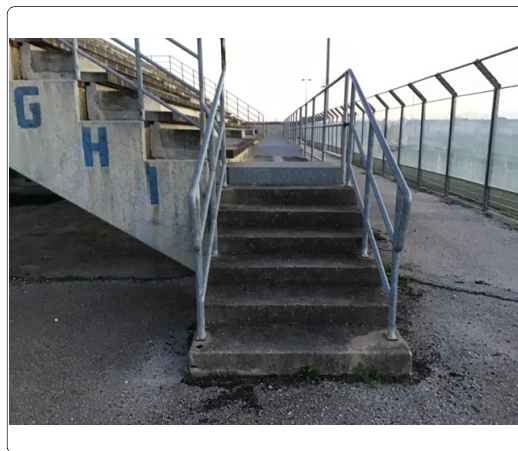

Esempio

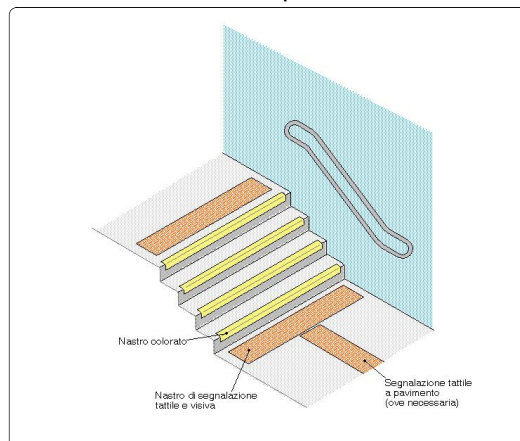

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
2,5

Stima scheda €. 230,00

Note integrative:

Seconda gradinata.

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-16

Criticità rilevata

Difficoltà di percezione della differenza di quota

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Adeguamento di una serie di gradini tramite **evidenziazione cromatica dell'angolo**: inserimento di fascia cromaticamente distinta dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima 10 cm, sulle pedate dei gradini, evidenziazione cromatica dell'alzata in modo da rendere visibili i gradini durante la salita.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.3 - 5.2 - 5.7
D.P.R. 503/96 art. 9 - 17
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

2

Stima scheda €. 100,00

Note integrative:

Esempio

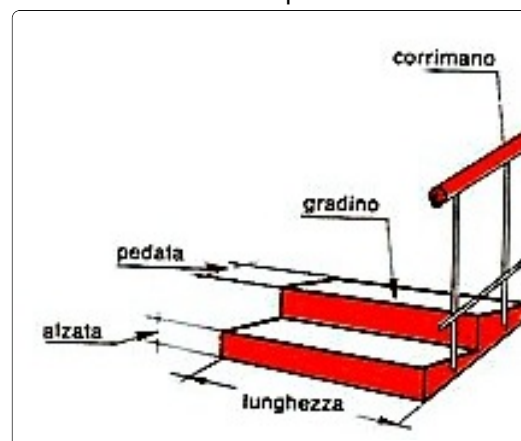

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-17

Criticità rilevata
piattaforma elevatrice: assenza

Localizzazione intervento

Scale



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Installazione di piattaforma elevatrice **con struttura in alluminio per esterno/interno.**

Dimensione del vano 1490x1600 mm

Corsa 6.30 m

Portata 250 Kg

Velocità 0.15 m/s

Fermate/servizi 3/3

Fossa 120 mm incassata

Distanza locale macchine – vano 1000 mm

Dislivello locale macchine – fossa 100 mm

Organi di sollevamento: Pistone oleodinamico.

Cabina: dimensioni interne 800x1200 mm

Profili in alluminio anodizzato

Cielino completo di luce d'emergenza in caso di blackout.

Ante di accesso in lamiera plastificata

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 12.000,00

Note integrative:

Per rendere accessibile la tribuna.

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-18

Criticità rilevata

Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare **l'inizio e la fine di una rampa scala** a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano

Materiale proposto:

**Tipo LogesVetEvolution
PVC**


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio

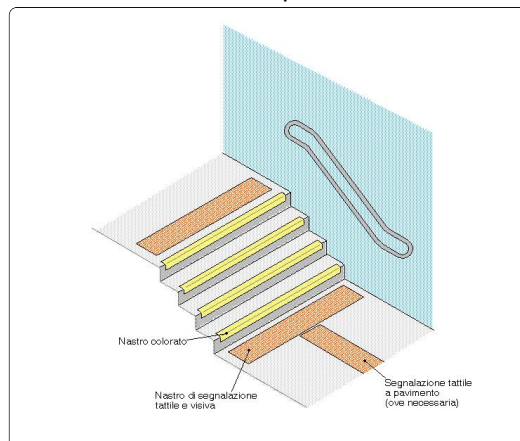

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

2

Stima scheda €. 190,00

Note integrative:

Seconda gradinata.

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-19

Criticità rilevata

Difficoltà di percezione della differenza di quota

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Adeguamento di una serie di gradini tramite **evidenziazione cromatica dell'angolo**: inserimento di fascia cromaticamente distinta dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima 10 cm, sulle pedate dei gradini, evidenziazione cromatica dell'alzata in modo da rendere visibili i gradini durante la salita.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.3 - 5.2 - 5.7
D.P.R. 503/96 art. 9 - 17
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

2

Stima scheda €. 100,00

Note integrative:

Esempio

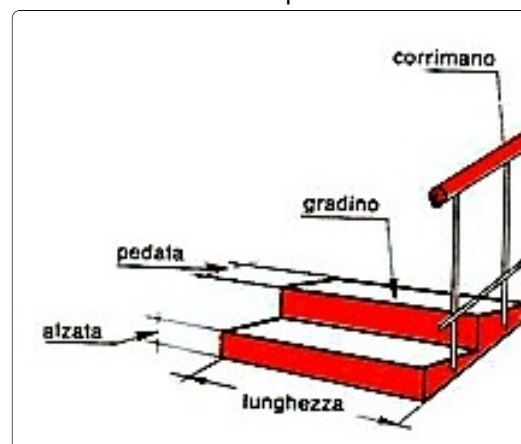

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-20

Criticità rilevata
Protezione: **assenza**

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di struttura (ringhiera, parapetto) atta a segnalare e proteggere da eventuali urti o cadute in prossimità di forti dislivelli o presenza di corpi sporgenti non eliminabili. Tale struttura dovrà essere priva di spigoli vivi ed elementi che possano costituire fonte di pericolo. Il manufatto avrà superficie antigraffio con colorazione idonea a presegnalare l'ostacolo a persone ipovendenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.8 - 4.1.10 -
4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.3 - 8.1.8 -
8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 15 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari


4

Stima scheda €. 440,00

Note integrative:

Protezione a terra per sottoscala.

Esempio



STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-21

Criticità rilevata
Protezione: **assenza**

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di struttura (ringhiera, parapetto) atta a segnalare e proteggere da eventuali urti o cadute in prossimità di forti dislivelli o presenza di corpi sporgenti non eliminabili. Tale struttura dovrà essere priva di spigoli vivi ed elementi che possano costituire fonte di pericolo. Il manufatto avrà superficie antigraffio con colorazione idonea a presegnalare l'ostacolo a persone ipovendenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.8 - 4.1.10 -
4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.3 - 8.1.8 -
8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 15 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari


4

Stima scheda €. 440,00

Note integrative:

Protezione a terra per sottoscala.

Esempio



STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-22

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite **demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa**, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Materiale proposto:

Asfalto


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Esempio

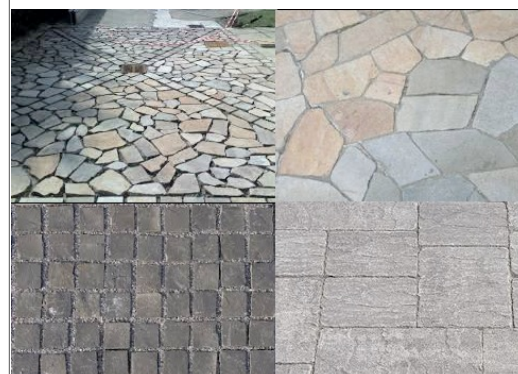

Lunghezza: 3,5 Larghezza: 1,5 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 540,00

Note integrative:

Dislivello in asfalto da raccordare.

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-23

Criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

Materiale proposto:

Massello autobloccante


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
D.P.R. 380/01 art.76 com.7

Foto del rilievo



Esempio

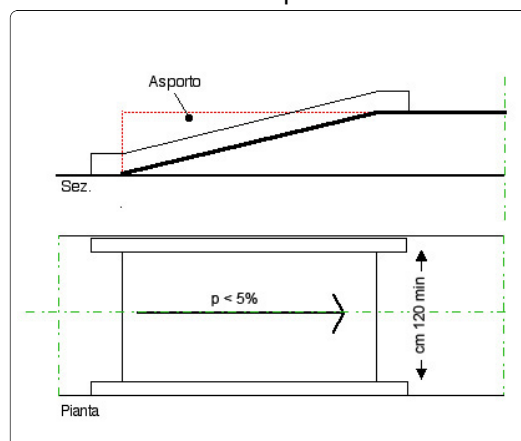

Lunghezza: 2 Larghezza: 1,5 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 710,00

Note integrative:

Raccordo rampa.

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-24

Criticità rilevata

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.
(Parcheggio a pettine ortogonale al percorso pedonale)

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al percorso pedonale.

L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.

La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso principale.

Attualmente abbiamo l'introduzione del contrassegno di parcheggio per disabili conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998.

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 250,00

Note integrative:

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 495/92 art. 40 C.d.S.-art. 149
Regolam.
Legge 104/92 art. 28
D.P.R. 151/2012

Foto del rilievo



Esempio



STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-25

Criticità rilevata
Protezione: **assenza**

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di struttura (ringhiera, parapetto) atta a segnalare e proteggere da eventuali urti o cadute in prossimità di forti dislivelli o presenza di corpi sporgenti non eliminabili. Tale struttura dovrà essere priva di spigoli vivi ed elementi che possano costituire fonte di pericolo. Il manufatto avrà superficie antigraffio con colorazione idonea a presegnalare l'ostacolo a persone ipovendenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.8 - 4.1.10 -
4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.3 - 8.1.8 -
8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 15 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari


4

Stima scheda €. 440,00

Note integrative:

Protezione a terra per sottoscala.

Esempio



STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-26

Criticità rilevata
Protezione: **assenza**

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di struttura (ringhiera, parapetto) atta a segnalare e proteggere da eventuali urti o cadute in prossimità di forti dislivelli o presenza di corpi sporgenti non eliminabili. Tale struttura dovrà essere priva di spigoli vivi ed elementi che possano costituire fonte di pericolo. Il manufatto avrà superficie antigraffio con colorazione idonea a presegnalare l'ostacolo a persone ipovendenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.8 - 4.1.10 -
4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.3 - 8.1.8 -
8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 15 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari


4

Stima scheda €. 440,00

Note integrative:

Protezione a terra per sottoscala.

Esempio

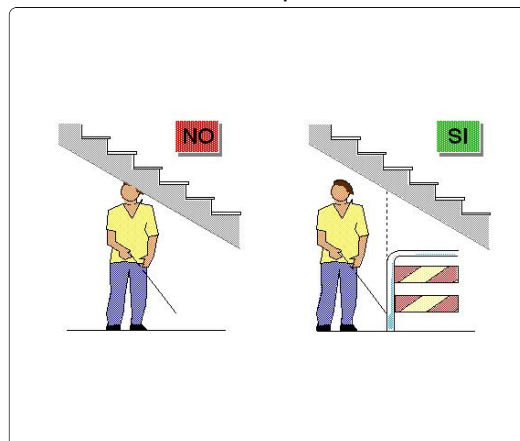

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-27

Criticità rilevata

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.
(Parcheggio a pettine ortogonale al percorso pedonale)

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al percorso pedonale.

L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.

La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso principale.

Attualmente abbiamo l'introduzione del contrassegno di parcheggio per disabili conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998.

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 250,00

Note integrative:

Parcheggio riservato inserito nella zona verde attuale. Andrà adeguata la pavimentazione per renderlo accessibile.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 495/92 art. 40 C.d.S.-art. 149
Regolam.
Legge 104/92 art. 28
D.P.R. 151/2012

Foto del rilievo



Esempio



STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-28

Criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale **a raso**, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Foto del rilievo




Lunghezza: 8 Larghezza: 2,5 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 2.430,00

Note integrative:

Nuovo attraversamento per collegare il parcheggio riservato di nuova realizzazione con la pavimentazione interna allo stadio.

Esempio

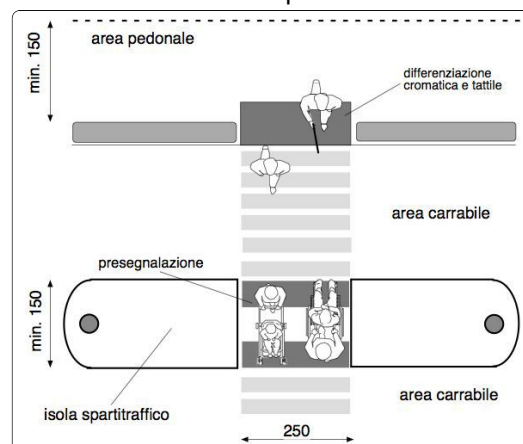

STADIO COMUNALE

1

cod. edificio
n. intervento

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

1-29

Criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

Materiale proposto:

Massello autobloccante


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
D.P.R. 380/01 art.76 com.7

Foto del rilievo



Esempio

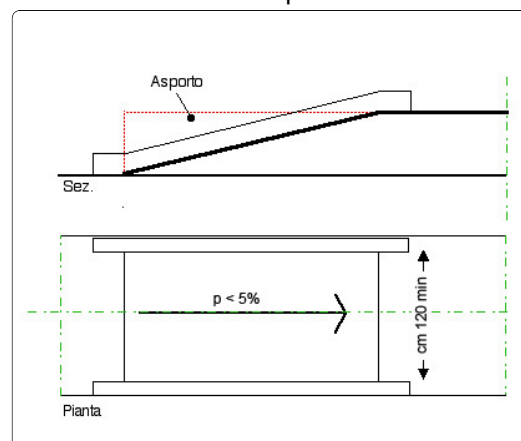

Lunghezza: 4 Larghezza: 1,5 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 1.430,00

Note integrative:

Raccordo rampa.

PEBA MESAGNE - AMBITO EDILIZIO CRITICITA' RILEVATE - RESOCONTO - STIMA

NOME UNITA' EDILIZIA

Stadio Comunale

identificativo

1

INDIRIZZO

Contrada Tagliata, 72023 Mesagne BR

STIMA TOTALE UNITA' EDILIZIA

€. 34.250,00
